






乙、顯示東深專用輸水管道對水質的影響之項目

注意事項:

- 第一期的專用輸水管道於二零零三年一月十八日開始啓用。
- 專用輸水管道(第一期及第二期)於二零零三年六月二十八日全線投入運作。
- 以下數據乃平均值。

週期	溶解氧 Dissolved Oxygen (毫克/公升)	五日生化需氧量 5-Day Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅) (毫克/公升)	總磷 (以P計) Total Phosphorus (as P) (毫克/公升)	硝酸鹽 (以N計) Nitrate (as N) (毫克/公升)	錳 Manganese (毫克/公升)
GB3838-2002第II類標準值	≥6	≤3	≤0.1	≤10	≤0.1
2001年10月至2002年9月	5.2	8.5	0.28	3.6	0.12
2002年4月至2003年3月	5.3	7.1	0.27	3.8	0.11
2002年10月至2003年9月	5.9	2.7	0.17	3.0	0.08
2003年4月至2004年3月	6.6	<2.0	0.10	2.2	0.05
2003年10月至2004年9月	6.6	<2.0	0.094	2.2	0.04
2004年4月至2005年3月	6.8	<2.0	0.082	2.1	0.04
2004年10月至2005年9月	7.1	<2.0	0.088	1.7	0.05
2005年4月至2006年3月	7.4	<2.0	0.072	1.4	0.04
2005年10月至2006年9月	7.6	<2.0	0.052	1.3	0.04
2006年4月至2007年3月	7.6	<2.0	0.053	1.4	0.04
2006年10月至2007年9月	7.5	<2.0	0.037	1.5	0.04
2007年4月至2008年3月	7.7	<2.0	0.041	1.5	0.04
2007年10月至2008年9月	7.6	<2.0	0.045	1.6	0.03
2008年4月至2009年3月	7.4	<2.0	0.043	1.5	0.03
2008年10月至2009年9月	7.3	<2.0	0.047	1.8	0.03
2009年4月至2010年3月	7.5	<2.0	0.050	1.9	0.03
2009年10月至2010年9月	7.7	<2.0	0.049	1.9	0.03
2010年4月至2011年3月	7.8	<2.0	0.045	1.8	0.03
2010年10月至2011年9月	8.1	<2.0	0.043	1.8	0.03

	專用輸水管道全線投入運作前
	專用輸水管道分階段投入運作
	專用輸水管道全線投入運作後

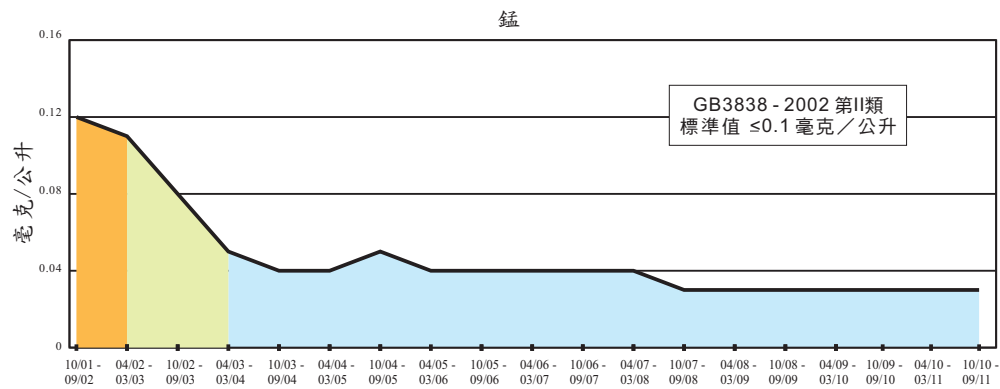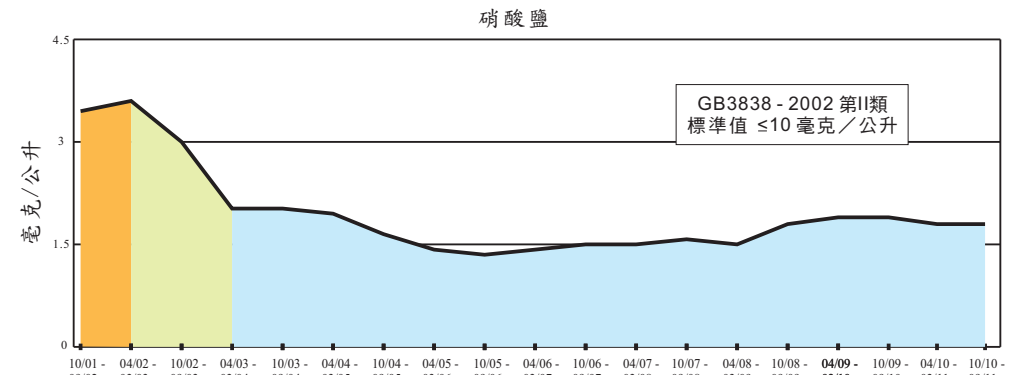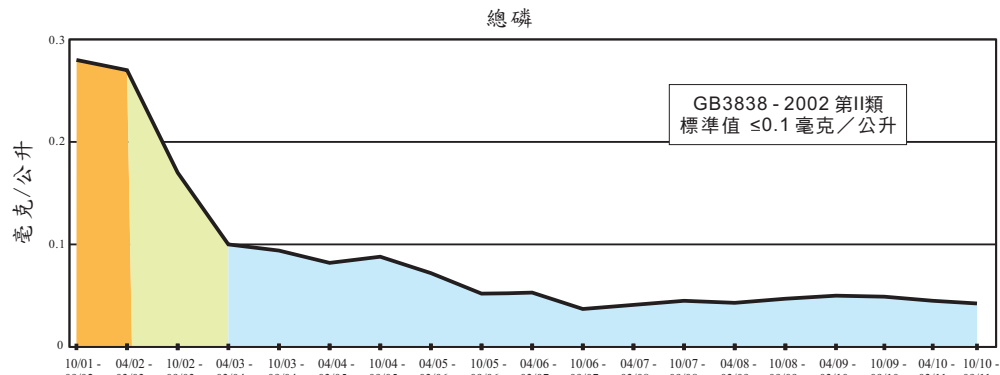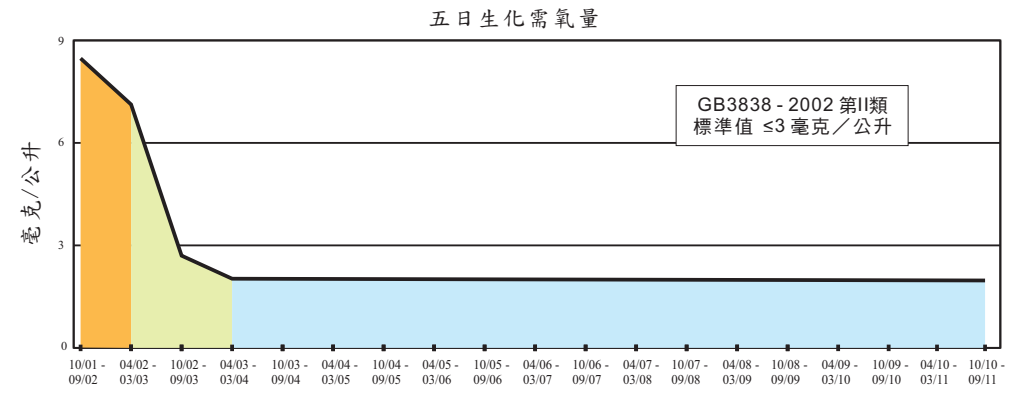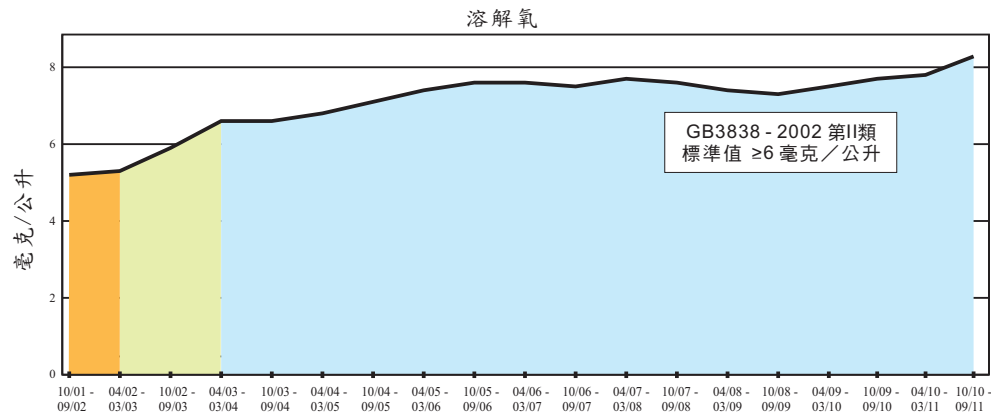

專用輸水管道全線投入運作前

專用輸水管道分階段投入運作

專用輸水管道全線投入運作後
